



L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 14/01/2022 + /
Rapport N°: 0571-220114-01
Date d'émission du rapport: 16/01/2022

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visateur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen
Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
V/ref.: /
L'agent-visateur: numéro 0571

Identification des tiers:

Client: CNOCKAERT - RENOV ELEC
Adresse: RUE AUX ANGES 10, 7951 TONGRE NOTRE DAME
Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: BRUNEAU
Adresse: RUE ADHEMAR MARECHAL 44, 7812 MOULBAIX
Responsable des travaux: CNOCKAERT - RENOV ELEC
Adresse: RUE AUX ANGES 10, 7951 TONGRE NOTRE DAME
Numéro de TVA: 0717389729

Identification de l'installation électrique:

Nom: BRUNEAU
Adresse: RUE ADHEMAR MARECHAL 44, 7812 MOULBAIX
Code EAN:
Numéro compteur: A installer
Cabine haute tension privée: Non
Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)
Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle:


1 Les appareils d'éclairages ne sont pas (tous) encore installés.
2 Les liaisons équipotentielles principales sont prévues mais elles doivent encore être raccordées au système de chauffage centrale et au conduites de la vmc quand ces derniers seront placés.
3 Les appareils de salle de bains (bain, douche,...) ne sont pas encore installés.
4 Les appareils ne sont pas (tous) encore installés.
Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué
Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

RE06_01-08_01 09-21
N° Rapport: 0571-220114-01



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N
Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 16 mm²
Type d'électrode de terre: Boucle de terre
Nombre de tableaux: 1
DESCRIPTION:
Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas
Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas
Voir schémas unifilaires et plans de position

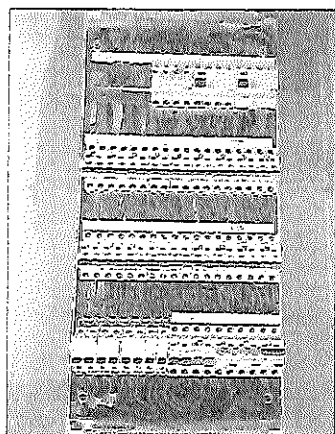

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A
Type de coupure générale: 4P 40A/300mA
Type de schéma de mise à la terre: TT
Nombre de circuits: 24 (réserve inclus)

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application
Localisation des canalisations souterraines: communiqué oralement

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:
Résistance de dispersion de la prise de terre: 3,38 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 20 MOhm
Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK
Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK
Continuité des conducteurs de protection: OK
Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 14/01/2047
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
- Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.



RE06_01-08_01 09-21
N° Rapport: 0571-220114-01
