

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 09/06/2021 Inspecteur: Frederic Barre Mentor: Installateur: Briatte Sebastien
Étiquette d'identification: N° TVA: BE 811 299 882 Référence du client: Liénard
Marque et type d'appareil de mesure: Metrel Eurotest ET61557 N° série: 19481280
Adresse de l'installation
Rue Rue Grande
Numéro 53
Boîte
Code postal 7050
Commune Herchies
Pays Belgique
Nom de contact Sebastien Briatte
Téléphone 067 33 06 63
Numéro Gsm (SMS)
Type : maison EAN : 541449020709078486 N° compteur: : 0434581

Type de contrôle: Contrôle périodique d'une installation domestique selon les RGIE livre 1 chapitre 6.5, et 8.2.2. et 4.2.4.3.
Distributeur: ORES Tension: 3~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1 Nombres circuits: 20 + 3 RI GEN: 0,029 MΩ
Prise de terre: Electrode verticale enterrée RE: 17,64 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

I _Δ (mA)	I _n (A)	I _n - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tout	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	CDEF PST	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	-			

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	32		3	6
16	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5
1	C	25		2	2,5
2	C	20		2	2,5

Contrôle visuel (général) ☒ BON ☐ PB Contact direct ☒ BON ☐ PB Contact indirect ☒ BON ☐ PB
Raccordement ☒ BON ☐ PB Schéma correct ☒ BON ☐ PB schéma en annexe par Aceg asbl ☐
Liaisons équipotentielles ☒ BON ☐ PB ☐ pas d'application ☐ en attente
Continuité ☒ BON ☐ PB Éclairage / machines ☒ BON ☐ PB ☐ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme au RGIE Livre 1. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 9/6/2046
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1. La visite de contrôle prévue par l'article 8.4.2. de RGIE livre 1, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe:



PUBLICATION DE LA VISITE TECHNIQUE

L'inspecteur Frédéric Barre

Signature EMPLOYE:



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481



Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 9/6/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.


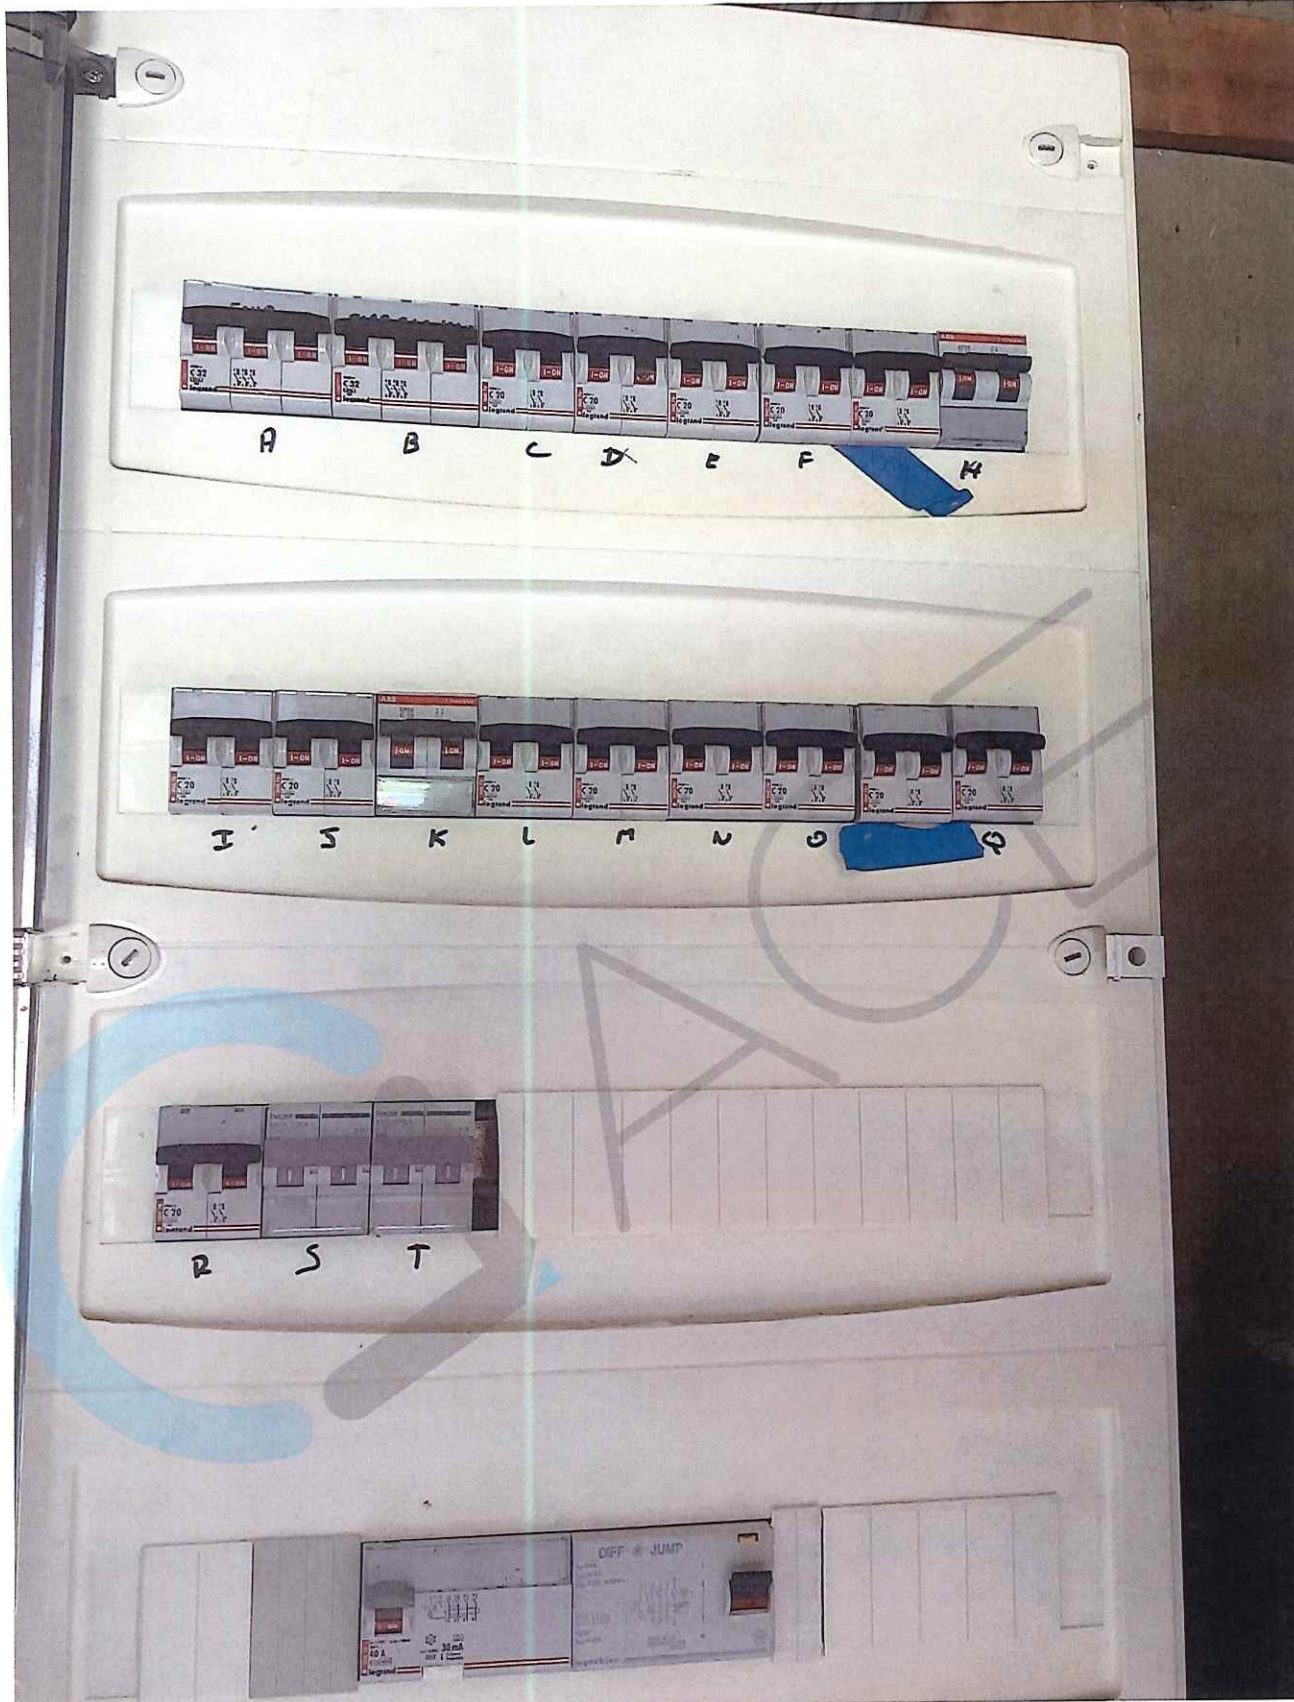





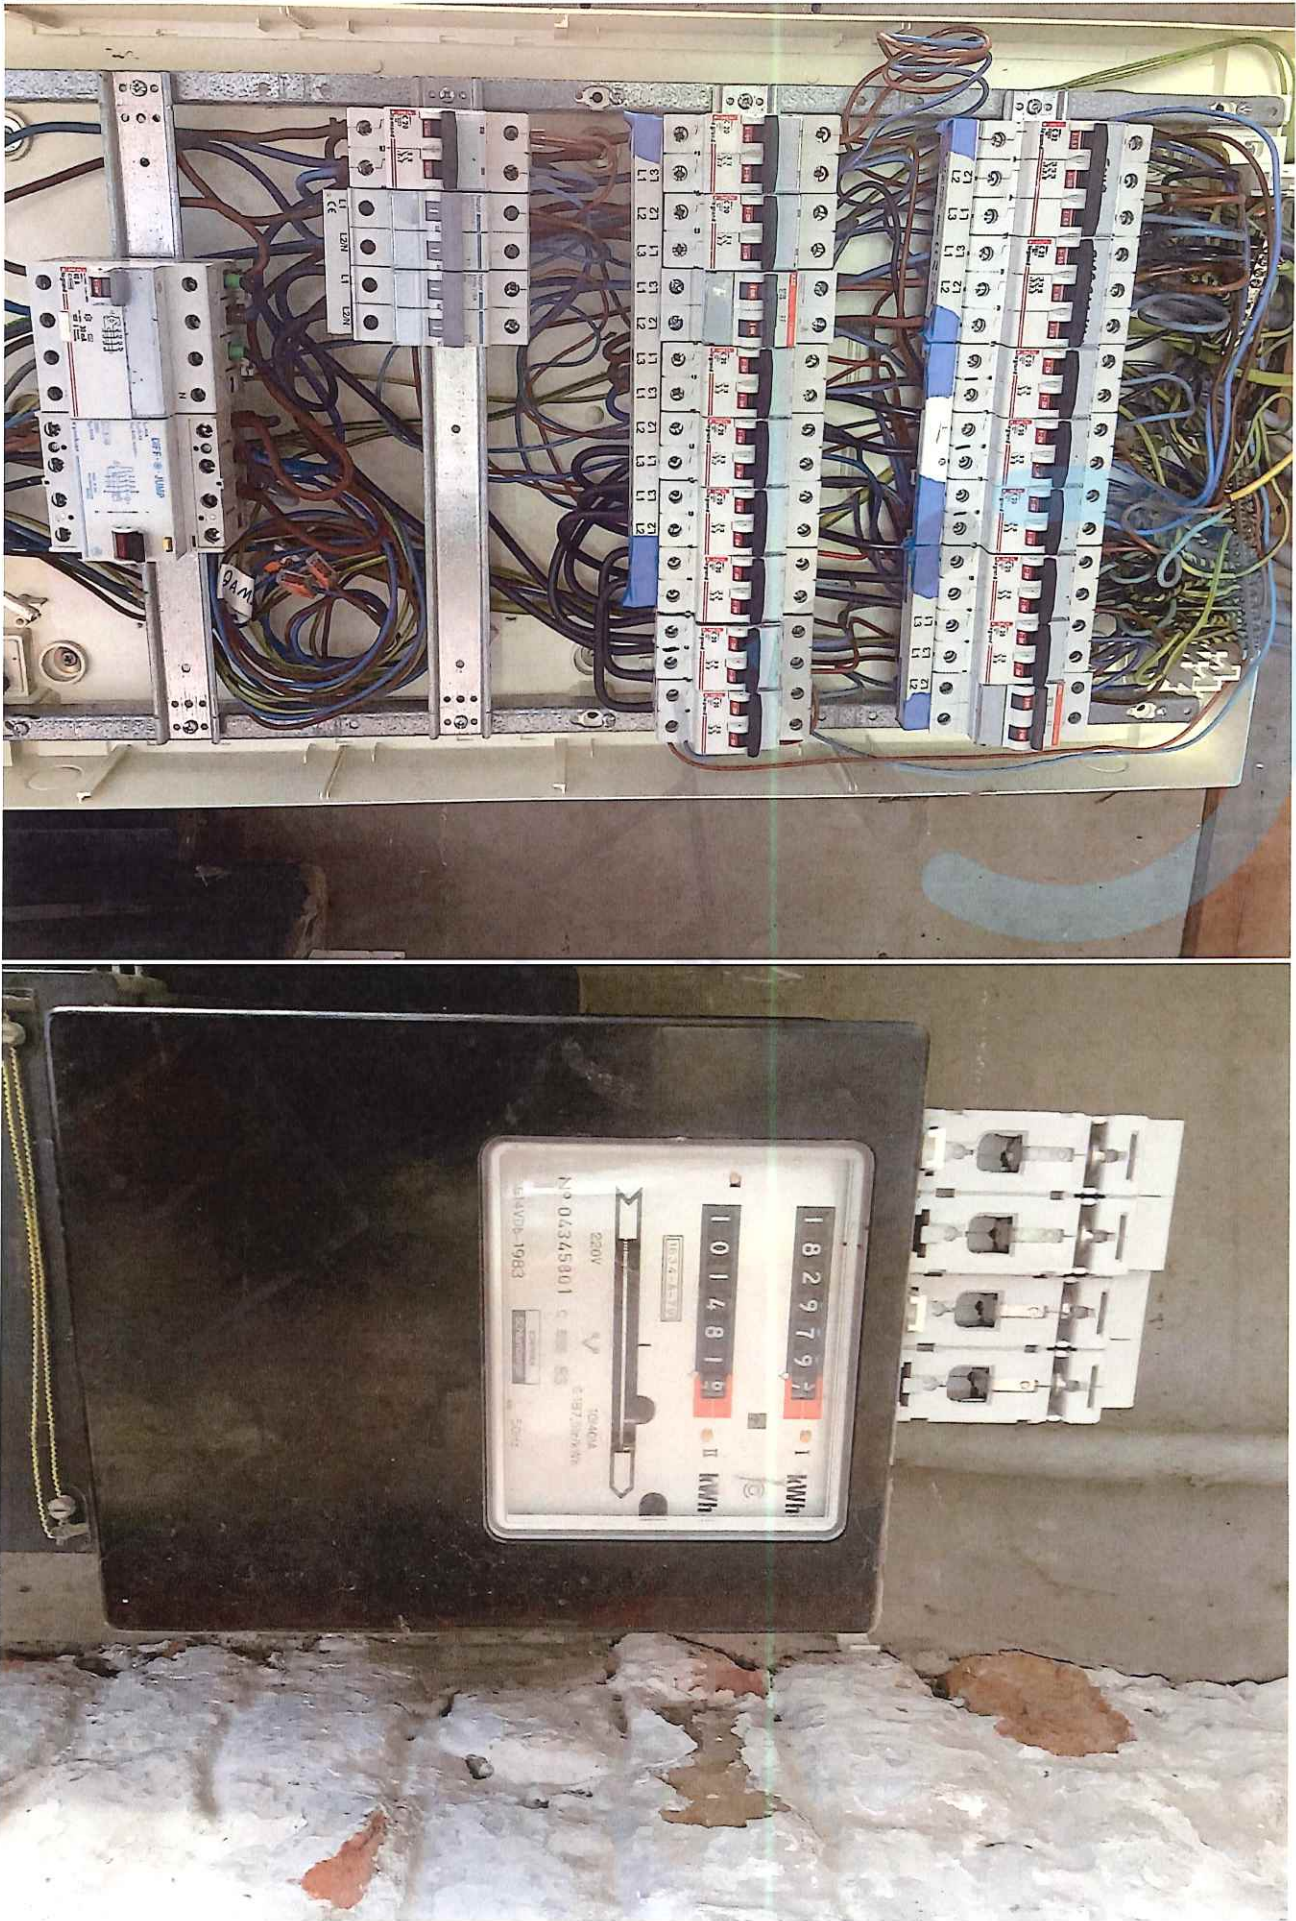

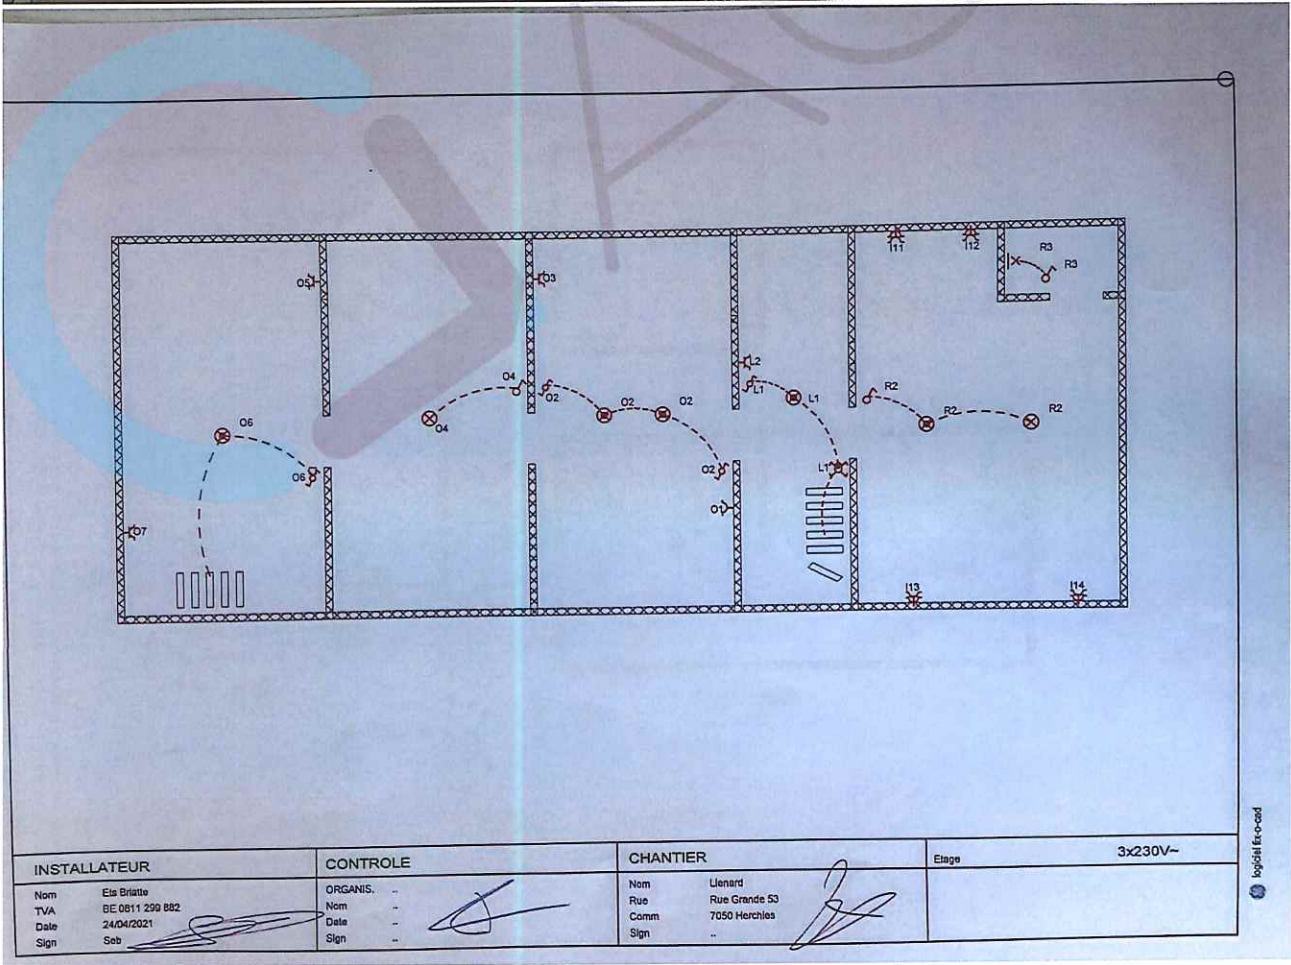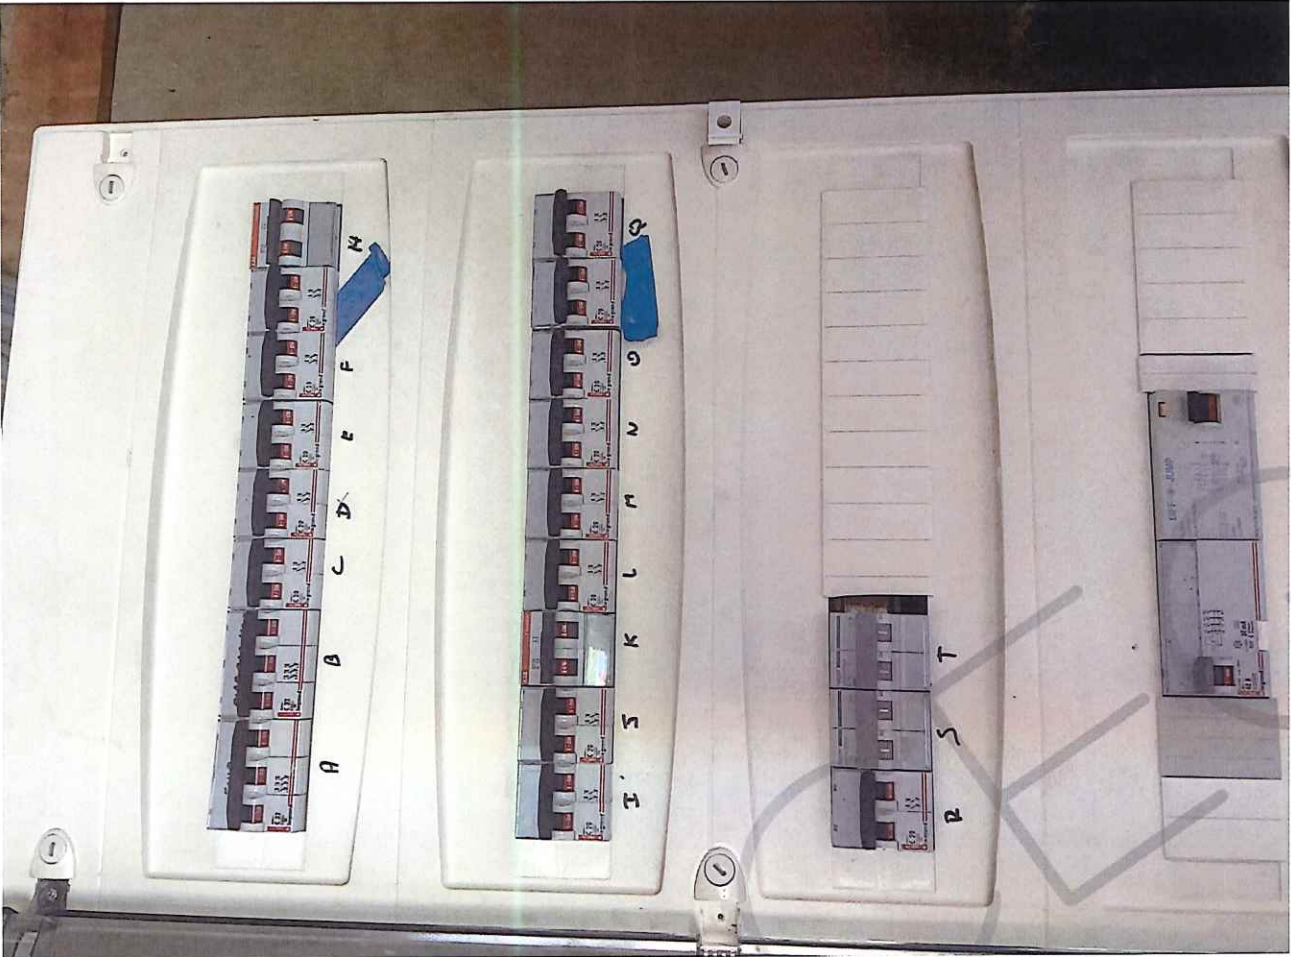


INSTALLATEUR		CONTROLE	CHANTIER	Etage	3x230V~
Nom	Els Briatte	ORGANIS.	Nom	Uenard	
TVA	BE 0611 239 882	Nom	Rue	Rue Grande 53	
Date	24/04/2021	Date	Comm	7050 Herchies	
Sign	Seb	Sign	Sign		

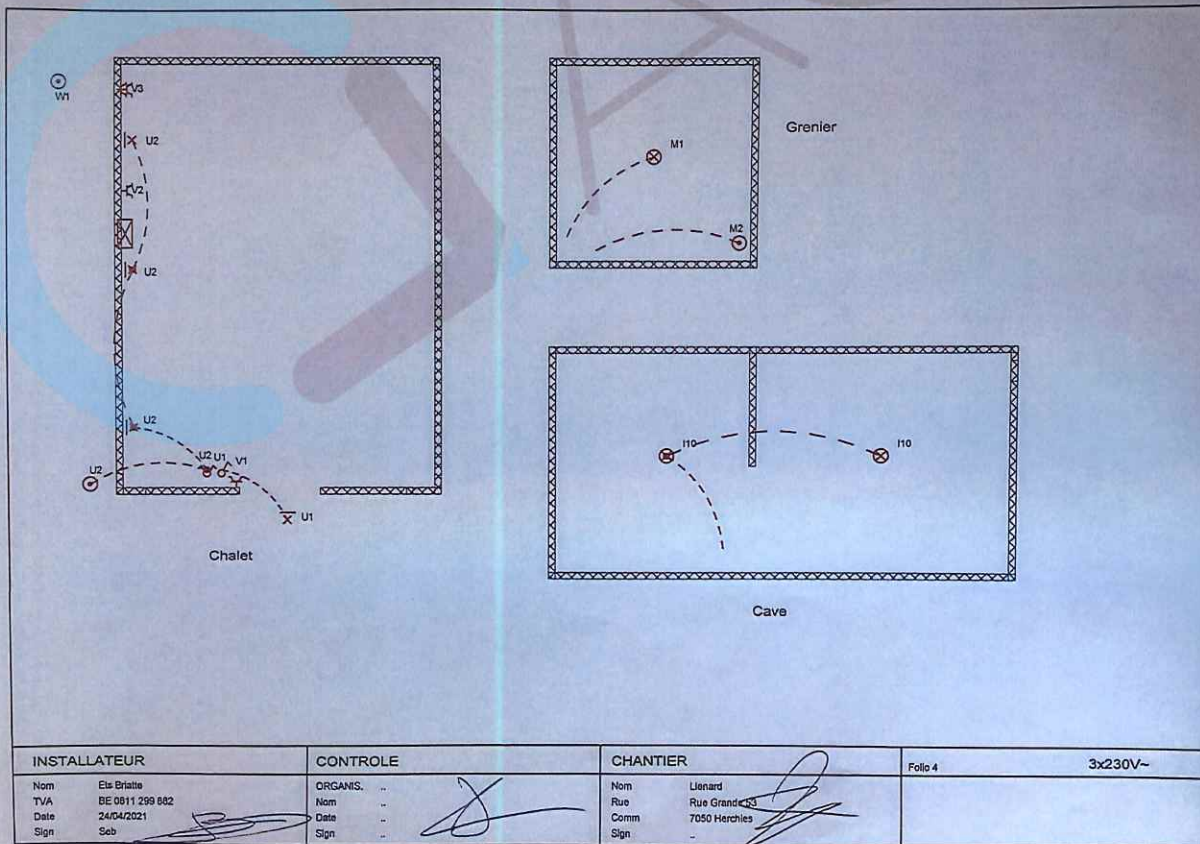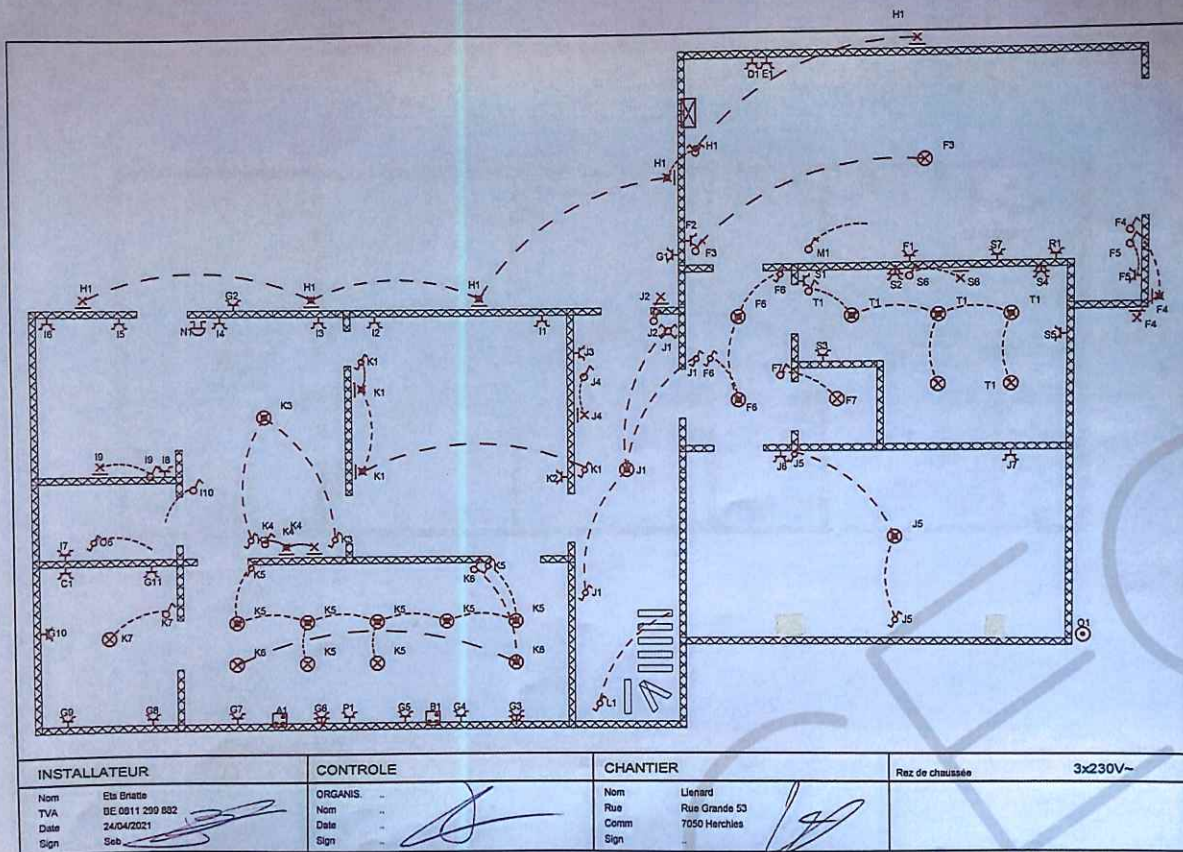

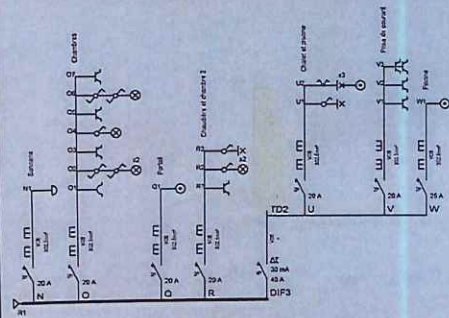

INSTALLATEUR		CONTROLE	CHANTIER	3x230V~
Nom	Elie Drouin	ORGANS	Nom	Lienard
TVA	00 (011 239 802)	Nom	Rue	Rue Grande 53
Date	24/04/2021	Date	Camin	7050 Houthuysen
Sign		Sign	Sign	

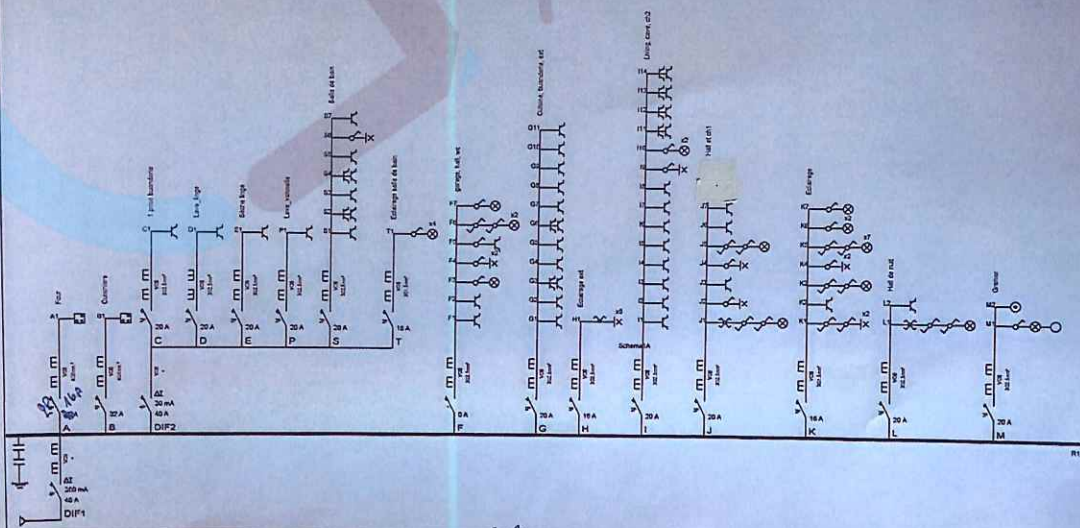

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		3x230V~	
Nom	Ela Sivalto	ORGANISME	03.02.2011 143 Eclairage Eclairage Barre	Nom	Lissard		
TVA	BT 0811 298 882	Nom		Rue	Rue Grande 13		
Date	24/04/2021	Date		Canton	1058 Hantover		
Sign		Sign		Sign			
